


ЛИНЕЕН ГРАФИК

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обект: Многофамилна жилищна сграда гр. Русе, ж.к. "Възраждане", ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №25, бл. „Неофит Рилски“, Вх. А, Б, В и Г

№	Видове СМР	Продължителност
1	Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Обект: Многофамилна жилищна сграда гр. Русе, ж.к. "Възраждане", ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №25, бл. „Неофит Рилски“, Вх. А, Б, В и Г	120 days
2	ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	120 days
3	Проектиране, съгласуване проекти	30 days
4	архитектура	10 days
5	конструкции	6 days
6	електро	4 days
7	енергийна ефективност	10 days
8	пожарна безопасност	3 days
9	ПБЗ	3 days
10	ПУСО	2 days
12	Откриване строителна площадка	1 day
13	ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА	90 days
14	мярка В1: Подмяна на дограма	58 days
15	етап I: Подмяна на дограма вх.А и Б	46 days
16	Демонтаж прозорци, врати и остъкление тераси	18 days
19	Демонтаж външни подпрозоречни перази	10 days
25	Демонтаж пана по тераси (остъклен тераси, тераси които ще се остъкляват и тераси които не се остъкляват и не са изградени)	4 days
26	Направа на нови паралети по тераси и балкони от зидария с блокчета Итонг	6 days
27	Направа на кофраж за стоманобетонен пояс с Н=0.20 м върху зидария от блокчета Итонг по новонаградени паралети по тераси и балкони	6 days
28	Пологане на бетон с армировка и анкериране към фасадни стени за направа на пояс върху зидария от блокчета Итонг по новонаградени паралети по тераси и балкони	6 days
29	Външна шпакловка, вътрешна ВЦ мазилка и трикратно боядисване вътрешно тераси по новонаградени паралети по тераси и балкони	6 days
35	етап II: Подмяна на дограма вх.В и Г	38 days
36	Демонтаж прозорци, врати и остъкление тераси	10 days
39	Демонтаж външни подпрозоречни перази	10 days
52	мярка В2: Топлоизолиране-саниране на стени	48 days
53	етап I: Топлоизолиране-саниране на стени вх.А и Б	48 days
54	Доставка, монтаж предпазна мрежа	12 days
55	Възстановяване на водоплътно материал във фугите между фасадните панели	6 days
57	Грундиране с готов грунд на фасадни стени	4 days
77	етап II: Топлоизолиране-саниране на стени вх.В и Г	40 days
79	Доставка, монтаж предпазна мрежа	12 days
90	Очужване на мазилка по тавази на новостъклен тераси и тераси които не се остъкляват	8 days
102	мярка В3: Топлоизолиране-саниране на покриви/ подпокривни пространства	90 days
103	етап I: Топлоизолиране-саниране на покриви/ подпокривни пространства вх.А и Б	60 days
104	Доставка и монтаж покривен термопанел 40 mm-за ап 1 вх.А, ап.б вх.Б, ап.1, ап.4, ап.6 и ап.18 вх.В, ап.3 и ап.6 вх.Г	8 days
105	Предварителна подготовка на основата почистяване	8 days
106	Възстановяване на армирана циментова замазка	8 days
107	Топлоизолация от минерална вата δ = 100 mm	8 days
108	Грундиране с битумен грунд за полагане на хидроизолация	13 days
109	Пологане на битумна хидроизолационна мембрана - първи слой без посилка	13 days
110	Пологане на битумна хидроизолационна мембрана - втори слой с посилка	26 days
111	Демонтаж на ламаринена обшивка на борд и поли покрив, машинно, комини	6 days
112	Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка с шир. до 50см на борд и поли покрив, машинно, комини	8 days
113	Събиране на керемиди	8 days
114	Демонтаж на олущи	8 days
115	Демонтаж на водосточни тръби	13 days
116	Демонтаж на водосточни казанчета	13 days
117	Доставка и монтаж на олущи	8 days
118	Доставка и монтаж на водосточни тръби	15 days
119	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	5 days
120	Монтаж на воронки и решетки отдушници	26 days
121	Доставка и монтаж на мрежа на отвори за ост. вентилация на студен покрив с размери 14/23 см	26 days
122	Очужване на мазилка на компромутирани комини	26 days
123	Мазилка на компромутирани комини /зидария, шпани, мазилка/	8 days
124	Почистяване, изнасяне и извеждане на строителни отпадъци от покрив над 8 км.	8 days
125	Ремонт на козирка над входна врата фасада север (очужване на уредена мазилка и изнасяне, полагане на нова хидроизолация на 2 пласта, направа на бордове и ламаринена обшивка, водосточни тръби)	32 days
126	етап II: Топлоизолиране-саниране на покриви/ подпокривни пространства вх.В и Г	67 days
128	Предварителна подготовка на основата почистяване	8 days
134	Демонтаж на ламаринена обшивка на борд и поли покрив, машинно, комини	6 days
136	Събиране на керемиди	8 days
137	Демонтаж на олущи	8 days
138	Демонтаж на водосточни тръби	13 days
139	Демонтаж на водосточни казанчета	13 days
145	Очужване на мазилка на компромутирани комини	26 days

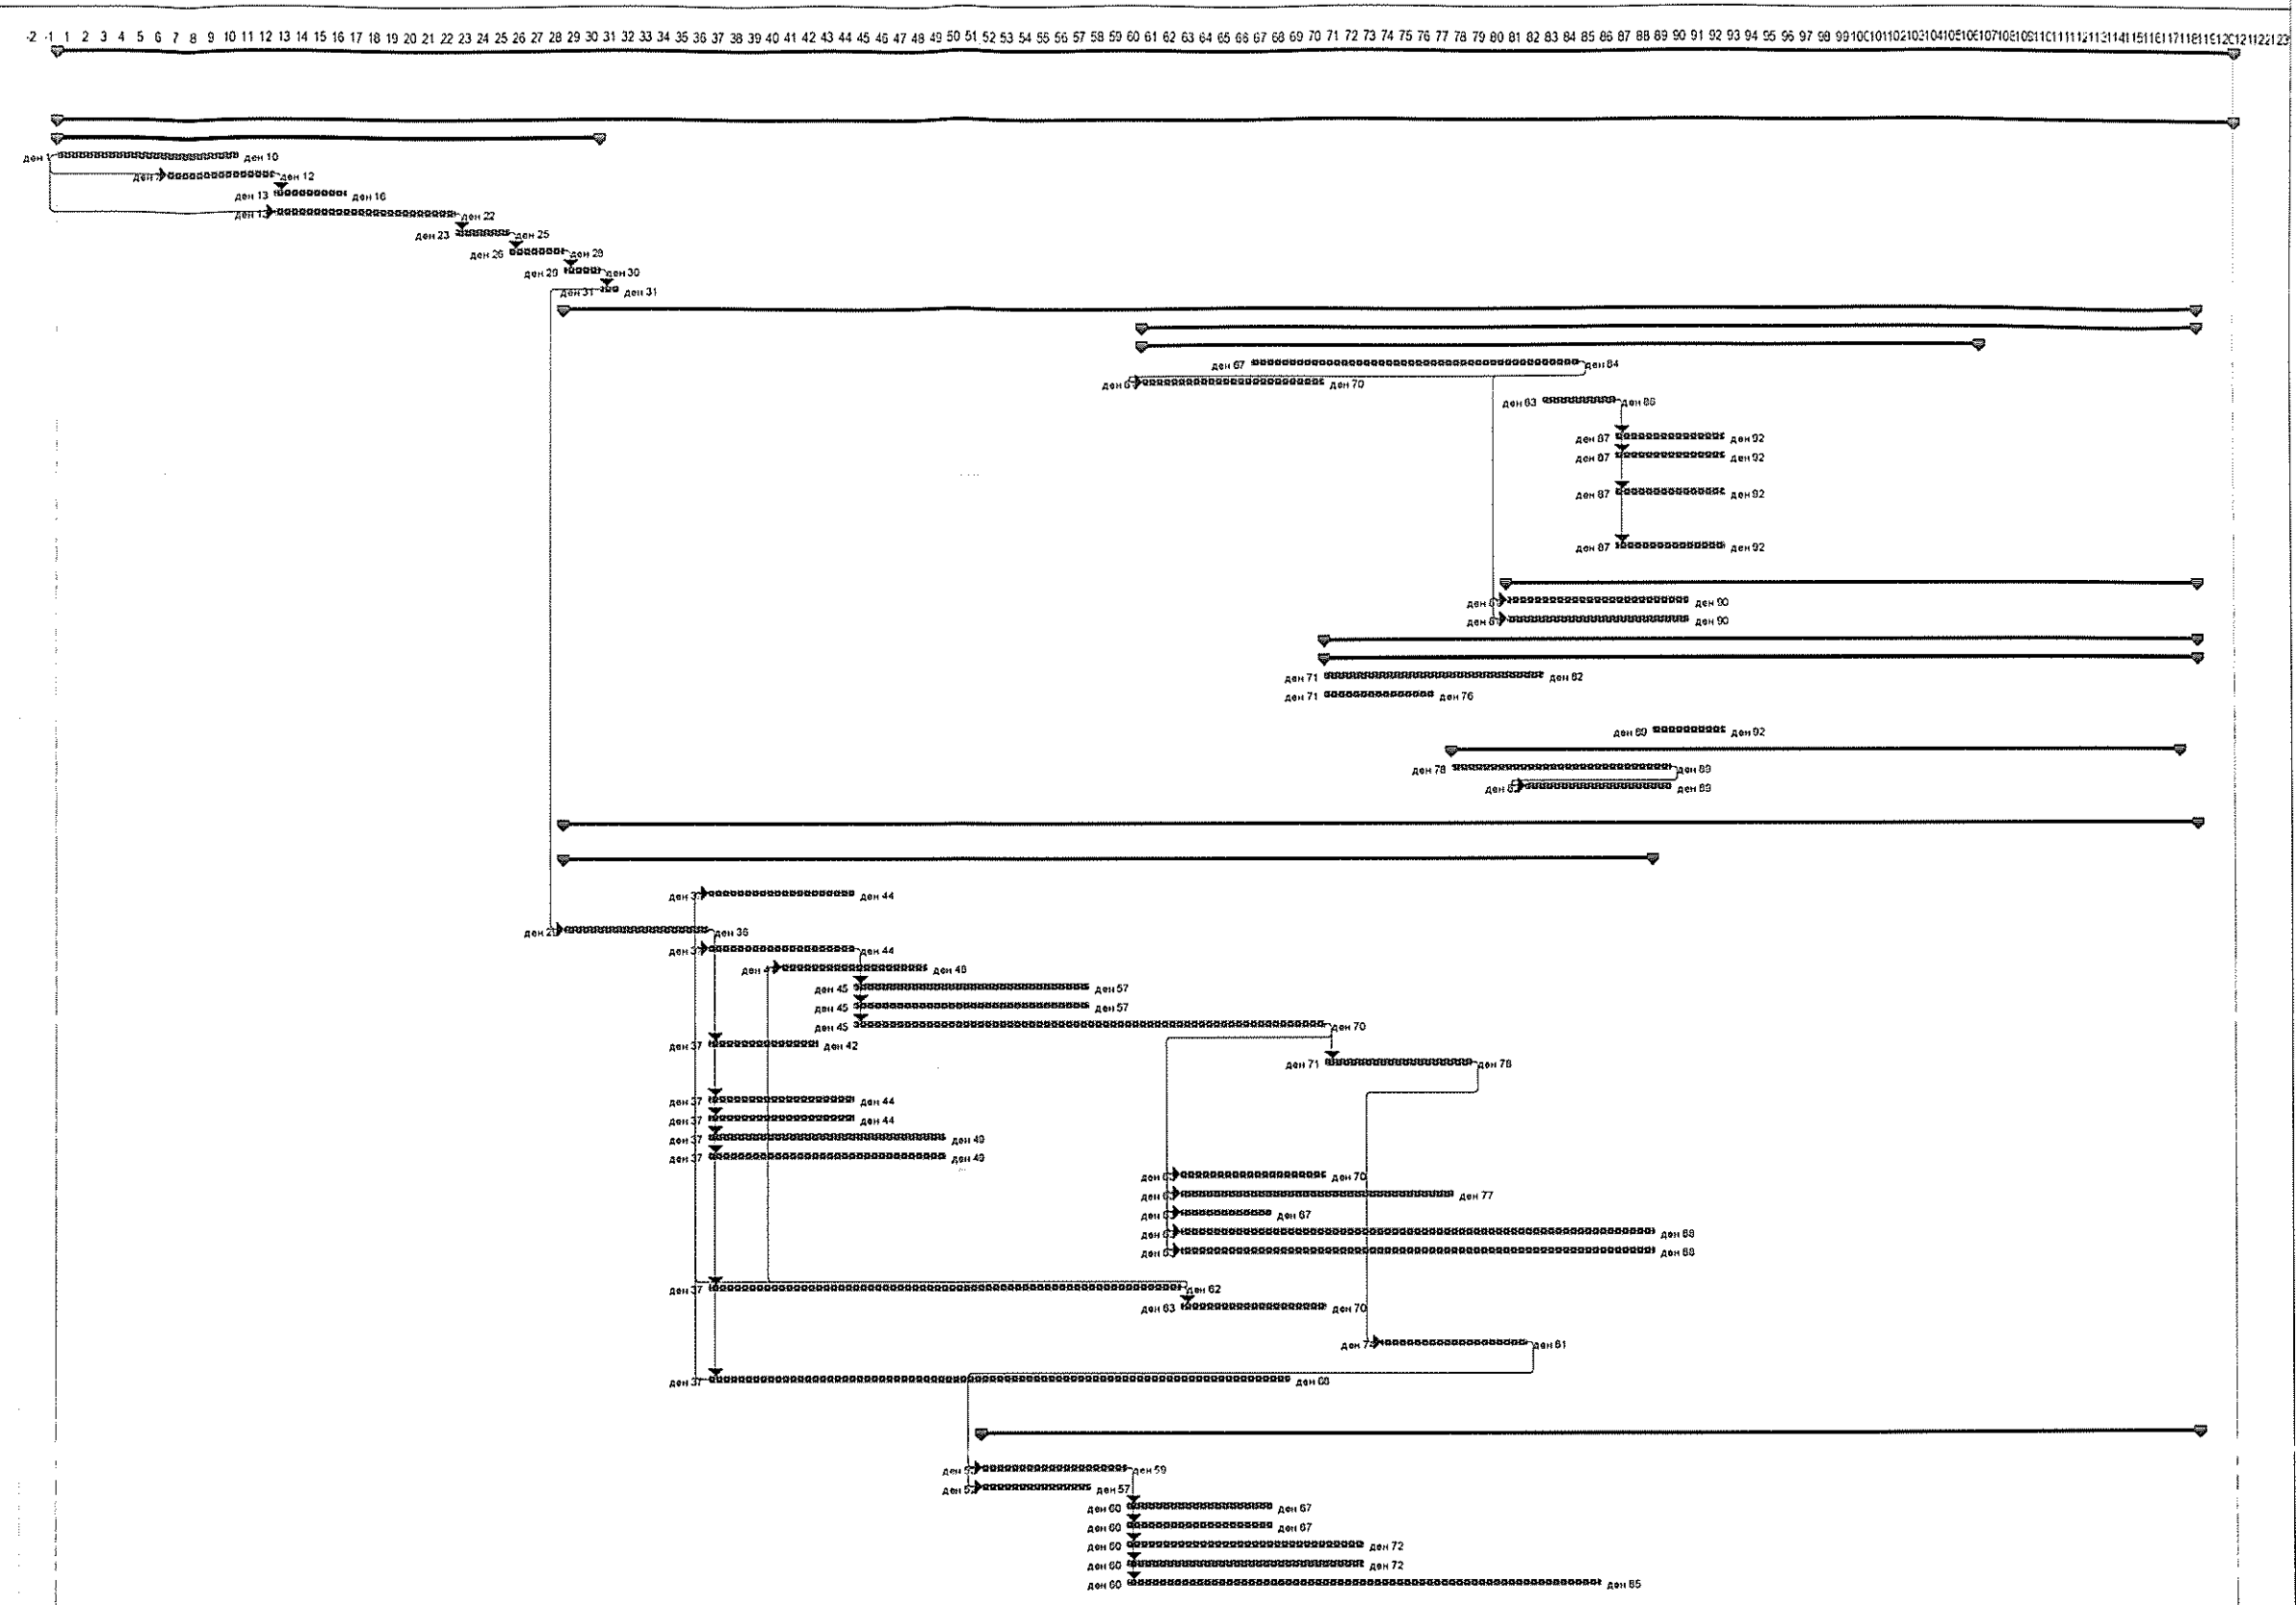

ПОДПИС И ПЕЧАТ
 Георги Иванов
 СЪБСТОЯТЕЛ НА ЗАГОТВИТЕЛЯ
