

Т. В. БОСНАКОВА

ID	Task Model	Наименование	Дни	Начало	Край	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРИДАВАНЕ НА ЕСМ ПО ОСОБЕНА ОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ЦДГ "РАДОСТ"																	
1	0 days	Начало		21.8.15	21.8.15												
2	1 day	ЕТАП I		21.8.15	21.8.15												
3	50 days	АС		22.8.15	13.10.15												
4		ЕСМ 1		22.8.15	25.8.15												
5				26.8.15	28.8.15												
6				28.8.15	29.8.15												
7		ЕСМ 2		29.8.15	31.8.15												
8				31.8.15	31.8.15												
9				31.8.15	2.9.15												
10				2.9.15	3.9.15												
11				3.9.15	4.9.15												
12				4.9.15	4.9.15												
13				4.9.15	5.9.15												
14				5.9.15	5.9.15												
15				5.9.15	6.9.15												
16				6.9.15	7.9.15												
17				7.9.15	7.9.15												
18				7.9.15	8.9.15												
19				8.9.15	8.9.15												
20				8.9.15	9.9.15												
21				9.9.15	9.9.15												
22				9.9.15	10.9.15												
23				10.9.15	10.9.15												
24				10.9.15	11.9.15												
25				11.9.15	11.9.15												
26				11.9.15	12.9.15												
27				12.9.15	12.9.15												
28				12.9.15	13.9.15												
29				13.9.15	13.9.15												
30				13.9.15	14.9.15												
31				14.9.15	14.9.15												
32				14.9.15	15.9.15												
33				15.9.15	15.9.15												
34				15.9.15	16.9.15												
35				16.9.15	16.9.15												
36				16.9.15	17.9.15												
37				17.9.15	17.9.15												
38				17.9.15	18.9.15												
39				18.9.15	18.9.15												
40				18.9.15	19.9.15												
41				19.9.15	19.9.15												
42				19.9.15	20.9.15												
43				20.9.15	20.9.15												
44				20.9.15	21.9.15												
45				21.9.15	21.9.15												
46				21.9.15	22.9.15												
47				22.9.15	22.9.15												
48				22.9.15	23.9.15												
49				23.9.15	23.9.15												
50				23.9.15	24.9.15												
51				24.9.15	24.9.15												
52				24.9.15	25.9.15												
53				25.9.15	25.9.15												
54				25.9.15	26.9.15												

Забележка: Датите в календара са условни. Календарните колони са визуализирани в седмици.

Актуалното на еталите/ЕСМ ще бъде еднозначно

Александър Николов



ID	Task Model	Инициалите	Дни	Начало	Край	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55				29.9.15	29.9.15										
56				29.9.15	4.10.15										
57				2.10.15	4.10.15										
58				29.9.15	4.10.15										
59				4.10.15	6.10.15										
60				6.10.15	6.10.15										
61		ЕСМ 1		7.10.15	12.10.15										
62				8.10.15	13.10.15										
63															
64		ЕСМ 2													
65															
66		ЕСМ 4		13.10.15	13.10.15										
67		Вик	25 days	28.8.15	22.9.15										
68				11.9.15	12.9.15										
69				12.9.15	14.9.15										
70				14.9.15	16.9.15										
71				16.9.15	18.9.15										
72				18.9.15	21.9.15										
73				28.8.15	29.8.15										
74				29.8.15	30.8.15										
75				30.8.15	31.8.15										
76				31.8.15	1.9.15										
77				1.9.15	2.9.15										
78				2.9.15	3.9.15										
79				3.9.15	4.9.15										
80				4.9.15	5.9.15										
81				5.9.15	6.9.15										
82				6.9.15	7.9.15										
83				3.9.15	4.9.15										
84				4.9.15	5.9.15										
85				7.9.15	8.9.15										
86				8.9.15	9.9.15										
87				8.9.15	9.9.15										
88				8.9.15	9.9.15										
89				8.9.15	9.9.15										
90				8.9.15	9.9.15										
91				8.9.15	9.9.15										
92				9.9.15	10.9.15										
93				9.9.15	10.9.15										
94				9.9.15	10.9.15										
95				7.9.15	8.9.15										
96				6.9.15	7.9.15										
97				5.9.15	6.9.15										
98				4.9.15	5.9.15										
99				10.9.15	11.9.15										
100				21.9.15	22.9.15										
101		Обик	34 days	28.8.15	1.10.15										
102				28.8.15	31.8.15										
103				31.8.15	5.9.15										
104				21.9.15	22.9.15										
105				22.9.15	26.9.15										
106				21.9.15	23.9.15										
107				21.9.15	22.9.15										

Забележка: Датите в календара са условни! Галенциите колони са визуализирани в седмици.

Актуалното на етапите ЕСМ ще бъде редактирано. Акт. включване на цели обекти

MM

Александър Николов

13.09.15



ID	Task Code	Task Name	Unit	Days		Start	End	Status
				Start	End			
108	000		21.9.15	23.9.15	-2			
109	000		6.9.15	7.9.15				
110	000		5.9.15	6.9.15				
111	000		5.9.15	6.9.15				
112	000		5.9.15	6.9.15				
113	000		5.9.15	6.9.15				
114	000		5.9.15	6.9.15				
115	000		5.9.15	6.9.15				
116	000		5.9.15	6.9.15				
117	000		6.9.15	21.9.15				
118	000		21.9.15	1.10.15				
119	000		26.9.15	28.9.15				
120	000		30.9.15	1.10.15				
121	000		29.9.15	1.10.15				
122	000		29.9.15	1.10.15				
123	000		29.9.15	1.10.15				
124	000	ECM 5	31.8.15	7.9.15				
125	000		31.8.15	1.9.15				
126	000		1.9.15	2.9.15				
127	000		2.9.15	4.9.15				
128	000		4.9.15	4.9.15				
129	000		4.9.15	4.9.15				
130	000		4.9.15	4.9.15				
131	000		4.9.15	4.9.15				
132	000		4.9.15	4.9.15				
133	000		4.9.15	5.9.15				
134	000		5.9.15	6.9.15				
135	000		5.9.15	5.9.15				
136	000		5.9.15	7.9.15				
137	000		7.9.15	8.9.15				
138	000		7.9.15	8.9.15				
139	000		7.9.15	9.9.15				
140	000		8.9.15	8.9.15				
141	000		8.9.15	8.9.15				
142	000		8.9.15	9.9.15				
143	000		8.9.15	9.9.15				
144	000		9.9.15	11.9.15				
145	000		11.9.15	13.9.15				
146	000		13.9.15	14.9.15				
147	000		13.9.15	13.9.15				
148	000		13.9.15	13.9.15				
149	000		13.9.15	14.9.15				
150	000		13.9.15	14.9.15				
151	000		13.9.15	14.9.15				
152	000		13.9.15	14.9.15				
153	000		14.9.15	14.9.15				
154	000		14.9.15	14.9.15				
155	000		14.9.15	14.9.15				
156	000		14.9.15	15.9.15				
157	000		14.9.15	15.9.15				
158	000		14.9.15	15.9.15				
159	000		14.9.15	15.9.15				
160	000		14.9.15	16.9.15				

Забележка: Датите в календара са условни. Календарните колони са индивидуализирани в седмици.


(M)

Актуалното на влизане/ЕСМ ще бъде единствено, ако приключване на целия обект е изпълнено в цялост.

Календарът е одобрен от
 [Signature]
 [Stamp]



ID	Trak Model	Кол	Назначаване	Дат	План		Септември													
					Начало	Краи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
161	16,915	18,915														
162	16,915	17,915														
163	17,915	19,915														
164	17,915	18,915														
165	17,915	18,915														
166	17,915	18,915														
167	16,915	17,915														
168	16,915	16,915														
169	5,915	5,915														
170	6,915	6,915														
171	6,915	6,915														
172	8,915	8,915														
173	9,915	9,915														
174	19,915	20,915														
175	31,815	3,915														
176	20,915	22,915														
177	26,815	13,1015														
178	26,815	26,815														
179	27,815	27,815														
180	27,815	27,815														
181	27,815	27,815														
182	27,815	27,815														
183	27,815	27,815														
184	27,815	27,815														
185	27,815	27,815														
186	27,815	27,815														
187	27,815	27,815														
188	27,815	28,815														
189	28,815	29,815														
190	29,815	29,815														
191	29,815	30,815														
192	30,815	31,815														
193	31,815	31,815														
194	31,815	31,815														
195	31,815	31,815														
196	31,815	31,815														
197	31,815	31,815														
198	2,915	2,915														
199	3,915	3,915														
200	3,915	3,915														
201	3,915	3,915														
202	4,915	4,915														
203	4,915	4,915														
204	4,915	4,915														
205	4,915	6,915														
206	6,915	7,915														
207	7,915	7,915														
208	7,915	7,915														
209	7,915	7,915														
210	8,915	8,915														
211	9,915	9,915														
212	9,915	10,915														
213	10,915	12,915														

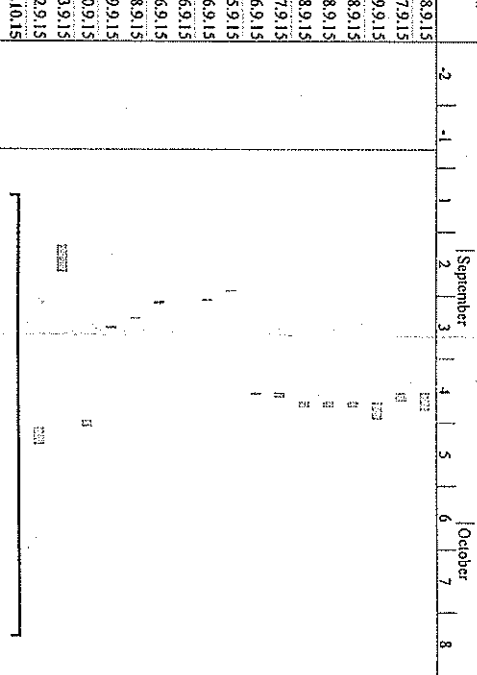

Забележка: Датите в календара са условни. Календарните кодове са визуализирани в септември.

Актуалното на еленив ЕСМ ще бъде вносиван след приключване на целия обект.
 Александър Николов
 Тел: 0884 22 11 22



ID	Task Mode	Код	Наименование	Дни	Начало	Край	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	СЗ				12.9.15	12.9.15	-2									
215	СЗ				12.9.15	12.9.15	-1									
216	СЗ				12.9.15	13.9.15										
217	СЗ				13.9.15	13.9.15										
218	СЗ				13.9.15	14.9.15										
219	СЗ				14.9.15	14.9.15										
220	СЗ				14.9.15	14.9.15										
221	СЗ				14.9.15	14.9.15										
222	СЗ				14.9.15	14.9.15										
223	СЗ				14.9.15	14.9.15										
224	СЗ				14.9.15	14.9.15										
225	СЗ				14.9.15	14.9.15										
226	СЗ				14.9.15	14.9.15										
227	СЗ				14.9.15	14.9.15										
228	СЗ				14.9.15	14.9.15										
229	СЗ				14.9.15	14.9.15										
230	СЗ				14.9.15	14.9.15										
231	СЗ				14.9.15	14.9.15										
232	СЗ				15.9.15	15.9.15										
233	СЗ				15.9.15	15.9.15										
234	СЗ				15.9.15	15.9.15										
235	СЗ				16.9.15	16.9.15										
236	СЗ				16.9.15	16.9.15										
237	СЗ				18.9.15	18.9.15										
238	СЗ				18.9.15	18.9.15										
239	СЗ				21.9.15	21.9.15										
240	СЗ				21.9.15	21.9.15										
241	СЗ				23.9.15	23.9.15										
242	СЗ				23.9.15	23.9.15										
243	СЗ				25.9.15	25.9.15										
244	СЗ				26.9.15	26.9.15										
245	СЗ				27.9.15	27.9.15										
246	СЗ				27.9.15	27.9.15										
247	СЗ				28.9.15	28.9.15										
248	СЗ				28.9.15	28.9.15										
249	СЗ				28.9.15	28.9.15										
250	СЗ				29.9.15	29.9.15										
251	СЗ				29.9.15	29.9.15										
252	СЗ				30.9.15	30.9.15										
253	СЗ				1.10.15	1.10.15										
254	СЗ				2.10.15	2.10.15										
255	СЗ				2.10.15	2.10.15										
256	СЗ				4.10.15	4.10.15										
257	СЗ				5.10.15	5.10.15										
258	СЗ				6.10.15	6.10.15										
259	СЗ				8.10.15	8.10.15										
260	СЗ				8.10.15	8.10.15										
261	СЗ				10.10.15	10.10.15										
262	СЗ				10.10.15	10.10.15										
263	СЗ				12.10.15	12.10.15										
264	СЗ				13.10.15	13.10.15										
265	СЗ				14.10.15	14.10.15										
266	СЗ				15.10.15	15.10.15										
					19.10.15	19.10.15										

ЕТАП III

6 days

Забележка: Датите в календара са условни. Календарните колонки са визуализирани в седмици.

Page 5

Александър Николов
Изпълнителен директор

Актуалното на еленинг/ЕСМ ще бъде еднокрайно, след приключване на целия обект

19.10
